

64-56 Projet de développement sur mandat

Gestion des risques

2023 - 2024

Groupe « Les Dat'Accros-bates »

Christophe Alexakis

Florian Naef

Pamela Verdon

Faton Zumeri

HEG – Haute Ecole de Gestion

Genève

Table des changements

Version	Date	Auteur / Autrice	Sous-titres / Chapitres	Description
V0	27.09.2023	Equipe		Version originale
V1	31.10.2023	Florian, Pamela	Mitigation des risques	Action préventive et action d'atténuation pour chaque risque
V2	22.11.2023	Pamela	Document entier	Ajout des risques 7 et 14 Ajustement des impacts et probabilités (tous les risques ne sont pas en vert)

Table des matières

Liste des risques	3
Mitigation des risques	4
Matrices des risques.....	6
Avant mitigation.....	6
Après mitigation	7

Liste des risques

No	Intitulé	Description	Impact	Proba
Risques de gestion de projet				
1	Mauvaise compréhension des besoins du mandant	Si nous examinons mal les besoins de notre mandant, nous ne pourrions pas développer une application pertinente.	4	3
2	Manque de compétences	Si nous constatons que nous n'avons pas les compétences techniques nécessaires nous devrions revoir notre planification et nous prendrions sûrement du retard.	3	2
3	Mauvaise définition des objectifs	Des objectifs mal définis et peu clairs rendraient la réalisation des tâches peu efficaces et engendreraient des heures de travail supplémentaires.	4	3
4	Mauvaise estimation du temps	Une mauvaise estimation du temps nécessaire pour la réalisation des tâches et par conséquent une mauvaise planification nous ferait prendre un retard considérable ou nous empêcherait éventuellement de terminer notre projet.	4	3
5	Demande d'ajout de fonctionnalités	Notre mandant pourrait avoir envie d'ajouter continuellement des fonctionnalités que nous n'avons pas définies avec lui.	4	3
Risques technologique et matériel				
6	Perte du code source	Si des problèmes de sauvegarde arrivaient, entraînant la perte partielle ou complète de notre code, nous devrions recommencer un travail déjà effectué.	5	2
7	Contraintes matérielles	Nous sommes dépendants de nos ressources matérielles et logicielles (ordinateur, logiciels et outils gratuits ou sous licence). Ainsi, si nous nous retrouvons face à une panne ou face à un manque de licence pour des outils payants, nous pourrions prendre du retard.	4	2
Risques de sécurité / juridique				
8	Vol de données / Sécurité insuffisante	Notre application traitera certaines données (par exemple : nom, prénom). Si ces données venaient à être volées par des personnes malveillantes, nous pourrions être tenus légalement responsables et les utilisateurs perdraient la confiance qu'ils nous ont donnée.	5	2
9	Nouvelles réglementations	Si des nouvelles réglementations sur le fonctionnement de la gymnastique aux Agrès entraînent en vigueur, tout le processus actuel sur la gestion des intervenants serait modifié et nous devrions modifier notre application.	4	2
Risque financier				
10	Manque de budget	Il est possible que nous ne trouvions pas de solution gratuite pour conserver les données sur un serveur et déployer l'application web.	3	4
Risques humains				
11	Perte de contacts avec le mandant	Si le mandant ne communique plus suffisamment avec nous ou ne répond plus à nos questions, nous ne pouvons pas avancer notre projet de façon optimale.	4	2
12	Mauvaise entente	Une mauvaise entente entre les membres du groupe créerait une ambiance pesante et empêcherait le bon développement de l'application.	3	2
13	Réduction de l'effectif	Un membre de l'équipe de développement pourrait abandonner le projet ce qui augmenterait la charge de travail des autres membres du groupe.	4	1
14	Résistance au changement	Les utilisateurs finaux pourraient se montrer réticents à utiliser notre application web.	4	2

Mitigation des risques

No	Intitulé	Mitigation	Impact	Proba
Risques de gestion de projet				
1	Mauvaise compréhension des besoins du mandant	Action préventive : S'assurer que tous les besoins sont validés par le mandant et effectuer un cahier des charges. Action d'atténuation : Nous prendrons contact avec notre mandant pour qu'il nous indique précisément les besoins mal compris et qu'il clarifie tous les points qui ne sont pas entièrement compris.	3	2
2	Manque de compétences	Action préventive : Privilégier des outils technologiques connus de toute l'équipe. Action d'atténuation : Demander de l'aide auprès des professeurs et assistants, ainsi que sur internet pour acquérir de nouvelles compétences.	2	1
3	Mauvaise définition des objectifs	Action préventive : S'assurer que tous les objectifs concordent avec les besoins du mandant. Action d'atténuation : Nous planifierons une réunion entre nous afin de redéfinir les objectifs et modifier la planification si nécessaire.	3	2
4	Mauvaise estimation du temps	Action préventive : Dans la planification, nous devons estimer le temps à la hausse et s'accorder du temps entre les tâches pour se laisser une marge d'erreur ou prendre de l'avance sur la suite. Action d'atténuation : Nous reverrons notre planification et nous travaillerons plus si besoin.	3	2
5	Demande d'ajout de fonctionnalités	Action préventive : Nous avons détaillé au mieux notre cahier des charges, signé par le mandant. Action d'atténuation : Nous nous tiendrons au cahier des charges sans accepter des ajouts que nous considérerons comme excessifs.	2	2
Risques technologique et matériel				
6	Perte du code source	Action préventive : Nous aurons, tout au long du projet, plusieurs sauvegardes de notre projet (cloud, GitHub, disques durs, en local) que nous effectuerons régulièrement. Seuls les membres du groupe ont accès au code original, nous enverrons des copies au mandant et au COPIL. Action d'atténuation : Chercher des possibilités de restauration. Discuter avec le mandant et le COPIL pour trouver des solutions afin de terminer le projet.	4	1
7	Contraintes matérielles	Action préventive : Se renseigner sur la fiabilité des outils que nous choisissons d'utiliser. Action d'atténuation : Être capable de se rabattre sur d'autres outils que ceux qui ne sont pas utilisables pour le moment.	3	2
Risques de sécurité / juridique				
8	Vol de données / Sécurité insuffisante	Action préventive : Mise en place d'une base de données sécurisée. Réfléchir à un plan de conservation de données sensibles. Action d'atténuation : Discuter avec le mandant et le COPIL et prévenir les personnes concernées par le vol.	4	2
9	Nouvelles réglementations	Action préventive : Demander à notre mandant si de nouvelles réglementations sont actuellement en discussion. Action d'atténuation : Prendre en compte les nouvelles réglementations et en discuter avec le mandant et le COPIL. Ensuite, suivre les nouvelles directives ou le cahier des charges établi au début du projet.	3	1

Risque financier


10	Manque de budget	Action préventive : Discuter avec le mandant pour l'avertir qu'il y a de fortes chances que nous ne trouvions aucune solution gratuite et qu'il puisse déjà négocier avec la Commission. Action d'atténuation : Nous devons discuter avec notre mandant pour débloquer un petit budget (faibles coûts d'hébergement et de déploiement). Si aucun budget ne nous est octroyé, l'application sera tout de même déployable en local.	2	4
----	------------------	---	---	---

Risques humains

11	Perte de contacts avec le mandant	Action préventive : Entretenir la communication avec le mandant pour qu'il se sente inclus dans le projet. Action d'atténuation : Nous contacterons la Commission Agrès et si cela ne suffit pas, nous en parlerons avec le COPIL pour trouver des solutions afin de tout de même terminer le projet.	3	1
12	Mauvaise entente	Action préventive : Nous mènerons tout au long du projet une politique d'écoute et d'entraide entre les membres du groupe. Action d'atténuation : Médiation entre les membres. S'il s'agit d'une très grosse mésentente, nous discuterons avec le mandant.	2	1
13	Réduction de l'effectif	Action préventive : Aucune mesure préventive. Action d'atténuation : Nous devons mettre en place une restructuration rapide de la planification et discuter avec notre COPIL pour qu'il soit plus compréhensif et adapte les modalités d'évaluation.	3	1
14	Résistance au changement	Action préventive : Se renseigner sur la volonté des futurs utilisateurs d'utiliser ou non notre application. Concevoir une interface utilisateur intuitive et conviviale en intégrant des messages d'aide ou des pages d'aide. Action d'atténuation : Mettre à disposition du mandant des manuels précis et vérifier qu'il connaisse bien le fonctionnement de l'application afin qu'il puisse répondre aux questions des utilisateurs lorsque nous lui aurons transmis l'application.	3	1

Matrices des risques

Avant mitigation

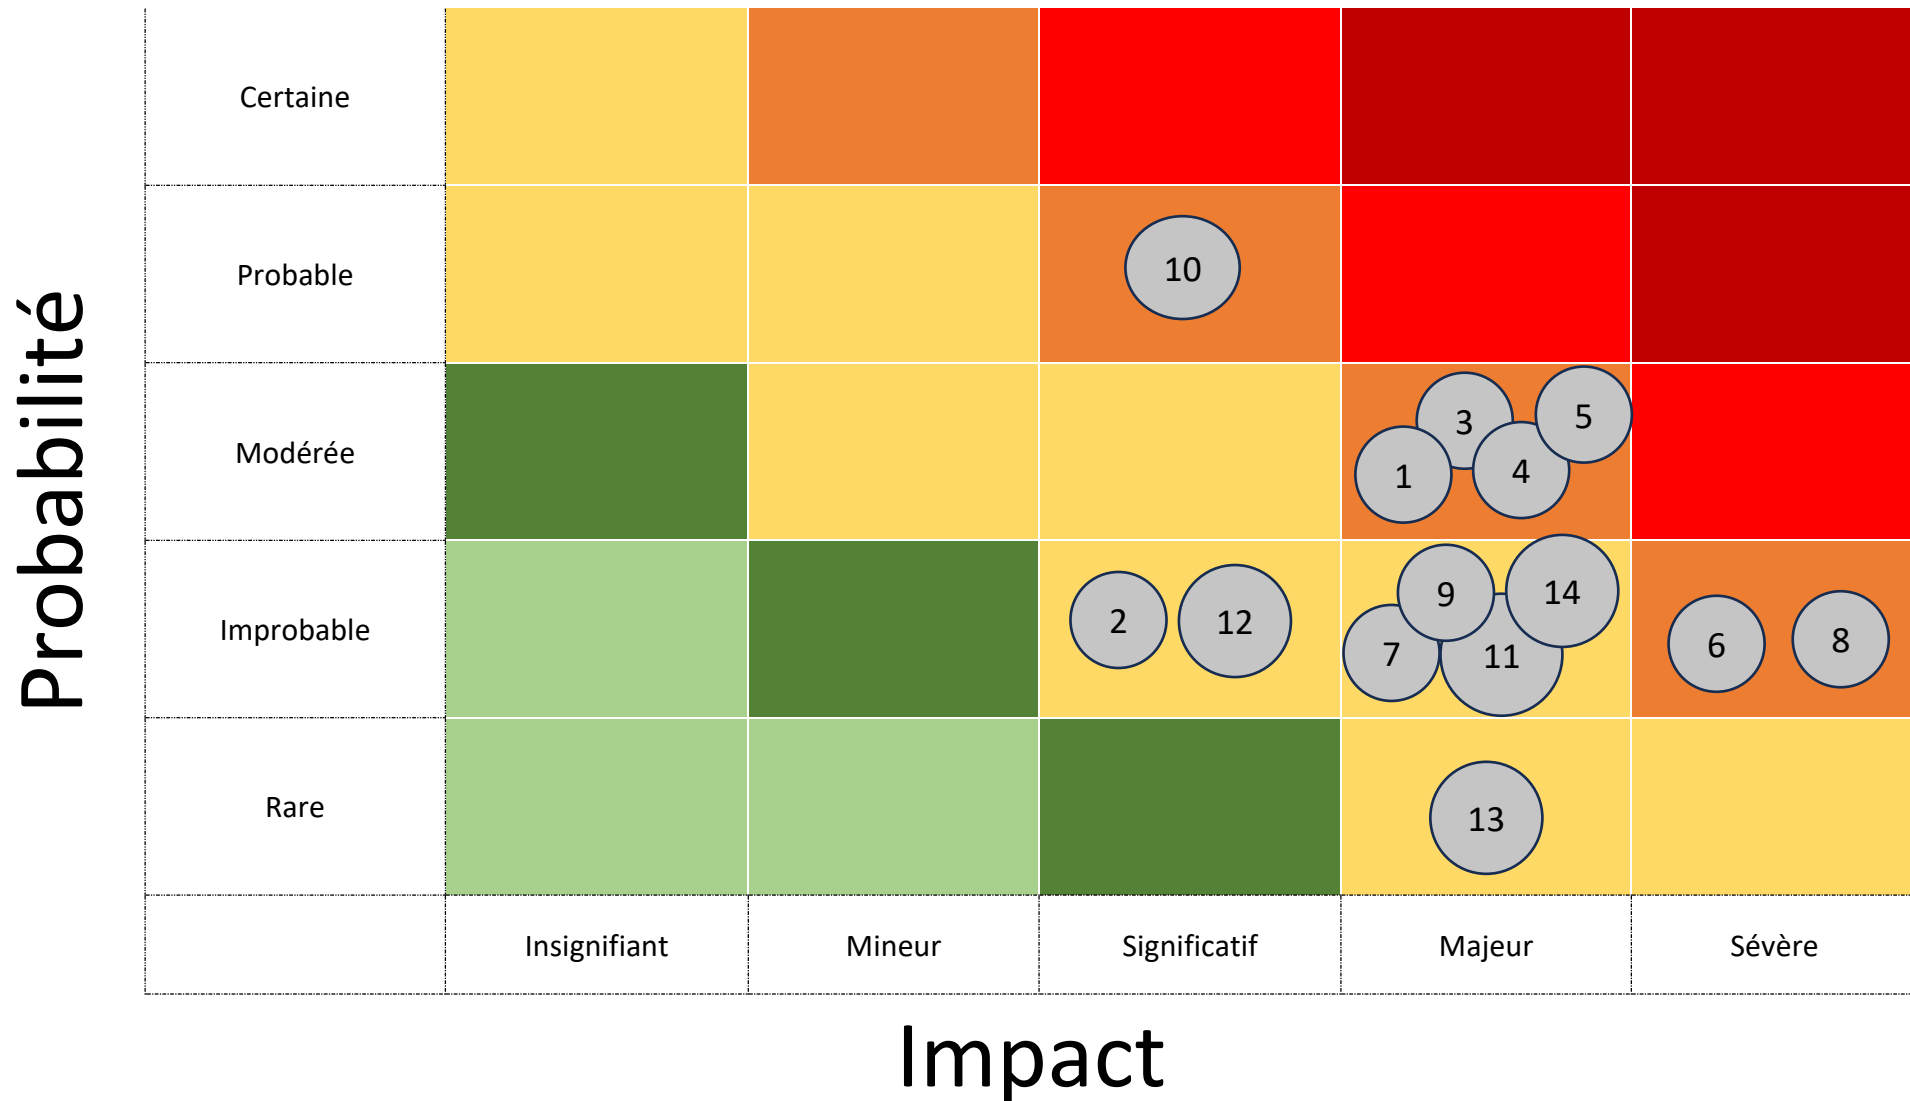

Probabilité

Certaine					
Probable		10			
Modérée					
Improbable		5	1 3 4 7	8	
Rare		2 12	9 11 13 14	6	
	Insignifiant	Mineur	Significatif	Majeur	Sévère

Impact
